




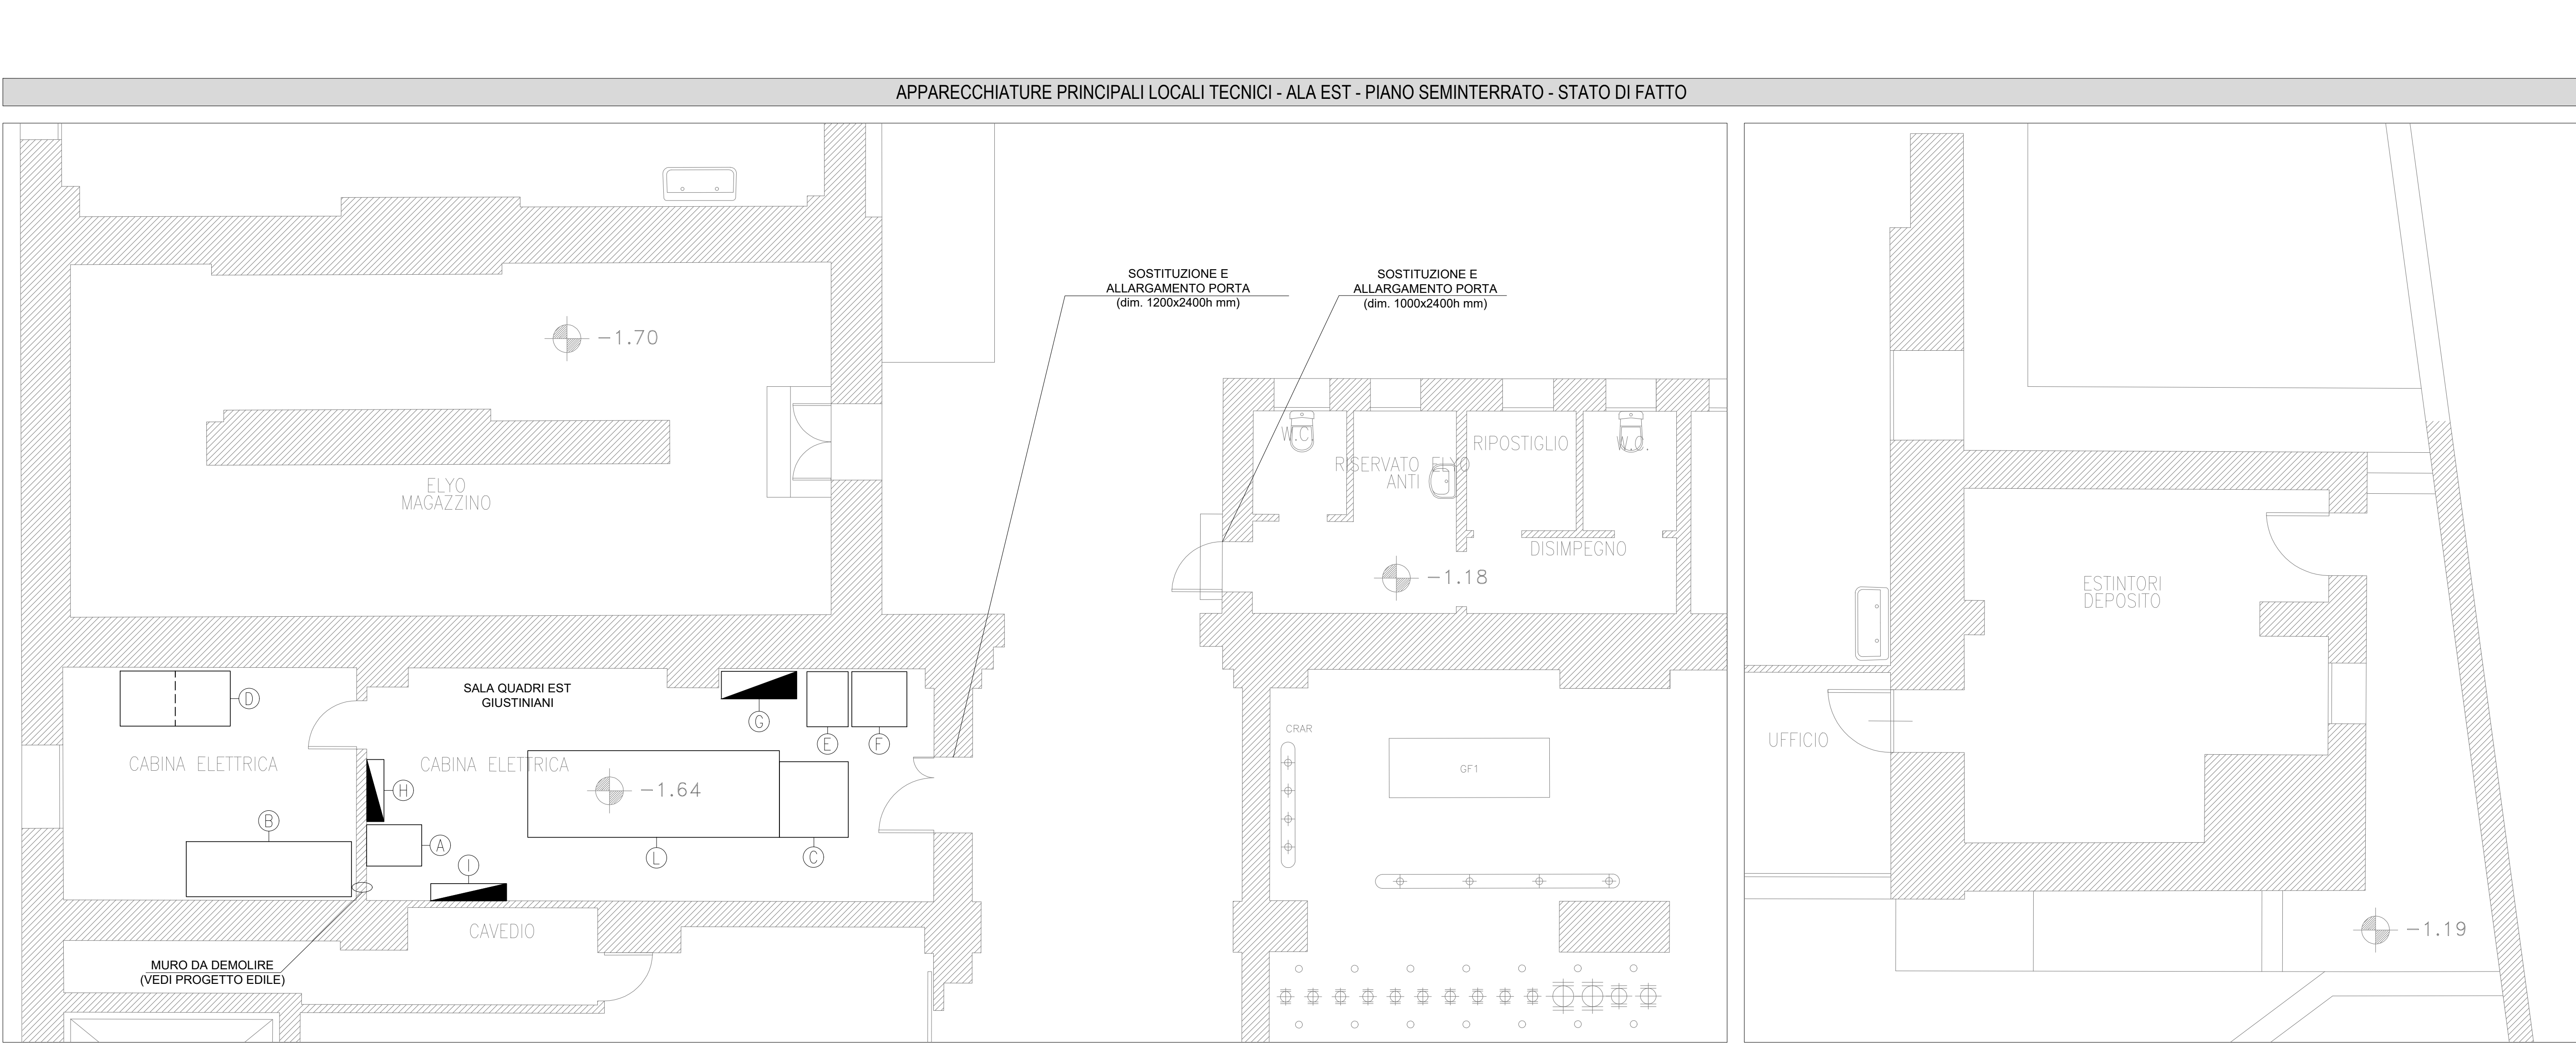

- ATTIVITA' 1: OPERE SALA QUADRI EST GIUSTINIANI E NUOVO LOCALE UPS E BATTERIE
1. SPOSTAMENTO DALLA SALA QUADRI BT "GIUSTINIANI EST":
 - BATTERIE SOCCORRITORE 110Vcc (B-B)
 - SOCCORRITORE (A-A)
 2. E LORO INSTALLAZIONE NEL NUOVO LOCALE UPS ;
 3. INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO GENERALE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (NUOVO LOCALE UPS) E ALIMENTAZIONE SEZIONE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEL QUADRO ESISTENTE (H-H);
 4. INSTALLAZIONE NUOVO UPS, RELATIVE BATTERIE E NUOVO QUADRO ELETTRICO CONTINUITA' ASSOLUTA Q.56.CA.01.N , ALIMENTAZIONE SEZIONE CA Q.56/BT.01 ;
 5. RIMOZIONE APPARECCHIATURE UPS I (C) DA 80kVA CON RELATIVE BATTERIE (D) E LORO COLLOCAZIONE PRESSO DEPOSITO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO A.O. PADOVA.
- OPERE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE: INTERVENTI DI CARATTERE EDILE/STRUTTURALE PER PERMETTERE L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE

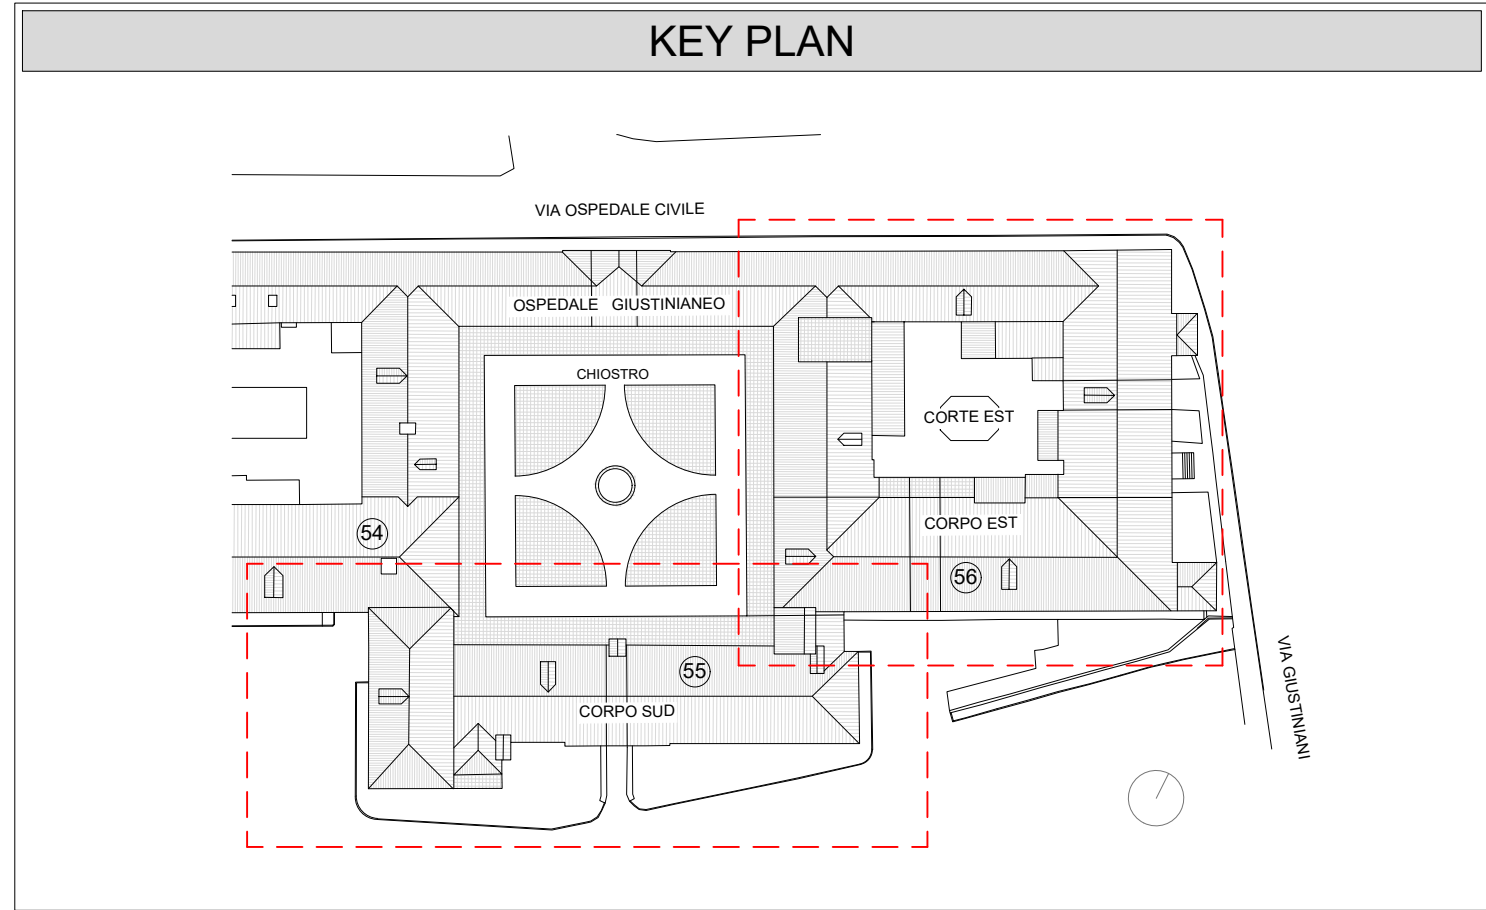

- LEGENDA
- APPARECCHIATURE ESISTENTI
 - APPARECCHIATURE ESISTENTI RIPOSIZIONATE E RICOLLEGATE
 - APPARECCHIATURE DI NUOVA INSTALLAZIONE
- LEGENDA STATO DI FATTO
- A SOCCORRITORE (dim. 600x800x1100mm) DA SPOSTARE
 - B BATTERIE SOCCORRITORE (dim. 2000x800x1650mm) DA SPOSTARE
 - C UPS 1 (dim. 1000x1100x1500mm) DA RIMUOVERE
 - D BATTERIE UPS 1 (dim. 2x(800x800mm) DA RIMUOVERE
 - E UPS 2 (dim. 600x800x1500mm) DA MANTENERE
 - F BATTERIE UPS 2 (dim. 800x800x1500mm) DA MANTENERE
 - G QUADRO ELETTRICO Q. SEZ UPS (Q.56.01.E.06) DA MANTENERE
 - H QUADRO ELETTRICO Q.56/SA.01 (dim. 900x250x2200mm) DA SPOSTARE
 - I QUADRO ELETTRICO Q.GEN CHIOSTRO Q.56-01.E.05 (dim. 1100x250x2200mm) DA SPOSTARE
 - L QUADRO ELETTRICO GENERALE BT ALA EST - Q.56/BT.01 (dim. 3600x1260x2200mm) DA MANTENERE
- LEGENDA STATO DI PROGETTO
- 1 NUOVO QUADRO ELETTRICO Q.56.BT.01.N (dim. ~4200x800x2100mm)
 - 2 NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' ASSOLUTA UPS TRIFASE-TRIFASE PN=120KVA (dim. 800x800x1500mm)
 - 3 NUOVE BATTERIE UPS AUTONOMIA 60min (dim. 2x(800x800mm))
 - 4 NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Q.56.LS.01.N (dim. 1000x400x2200mm)
 - 5 NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE CONTINUITA' ASSOLUTA Q.56.CA.01.N (dim. 2700x800x2100mm)
 - 6 NUOVO GRUPPO ELETTROGENO Pn=110KVA-90kW (LTP) Vn=400V-50Hz 3F+N, ENTRO COFANATURA INSONORIZZANTE 70dBA A 7m, DOTATO DI SERBATOIO INCORPORATO DA ALMENO 450 litri (AUTONOMIA >24H AL 75% DEL CARICO) (dim. 2400x1200x2300mm)
 - 7 CAMMINO DI ESPULSIONE FUMI COMBUSTI IN ACCIAIO INOX AISI 316, COIBENTATO DIAM. INT. 200mm, ESTESO FINO ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO PIU' ALTA (COMPRESO NELLE OPERE EDILI)
 - 8 GRIGLIA DI ESPULSIONE ARIA CON ALETTE PARAPIOGGIA E RETE ANTIANIMALE (dim. 1300x2650mm) COMPRESA NELLE OPERE EDILI
 - 9 GRIGLIA FISSA DI ASPIRAZIONE ARIA CON ALETTE PARAPIOGGIA E RETE ANTIANIMALE (dim. 900x1500mm) COMPRESA NELLE OPERE EDILI
 - 10 PORTA CON GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA CON ALETTE PARAPIOGGIA E RETE ANTIANIMALE (dim. 900x2100mm) COMPRESA NELLE OPERE EDILI
 - A SOCCORRITORE (dim. 600x800x1100mm) - SPOSTATO
 - B BATTERIE SOCCORRITORE (dim. 2000x800x1650mm) - SPOSTATO
 - E UPS 2 (dim. 600x800x1500mm) , P=60KVA
 - F BATTERIE UPS 2 (dim. 800x800x1500mm)
 - G QUADRO ELETTRICO Q. SEZ UPS (Q.56/+01.E.06)
 - H QUADRO ELETTRICO Q.56/SA.01 (dim. 900x250x2200mm) - SPOSTATO
 - I QUADRO ELETTRICO Q.GEN CHIOSTRO (dim. 1100x250x2200mm) - SPOSTATO
 - L QUADRO ELETTRICO GENERALE BT ALA EST - Q.56/BT.01 (dim. 3600x1260x2200mm)
 - M ALLARGAMENTO E NUOVA PORTA DEL NUOVO LOCALE UPS (dim. 1000x2400mm) (COMPRESA NELLE OPERE EDILI)
 - N ALLARGAMENTO E NUOVA PORTA DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA (dim. 1200x2400mm) (COMPRESA NELLE OPERE EDILI)

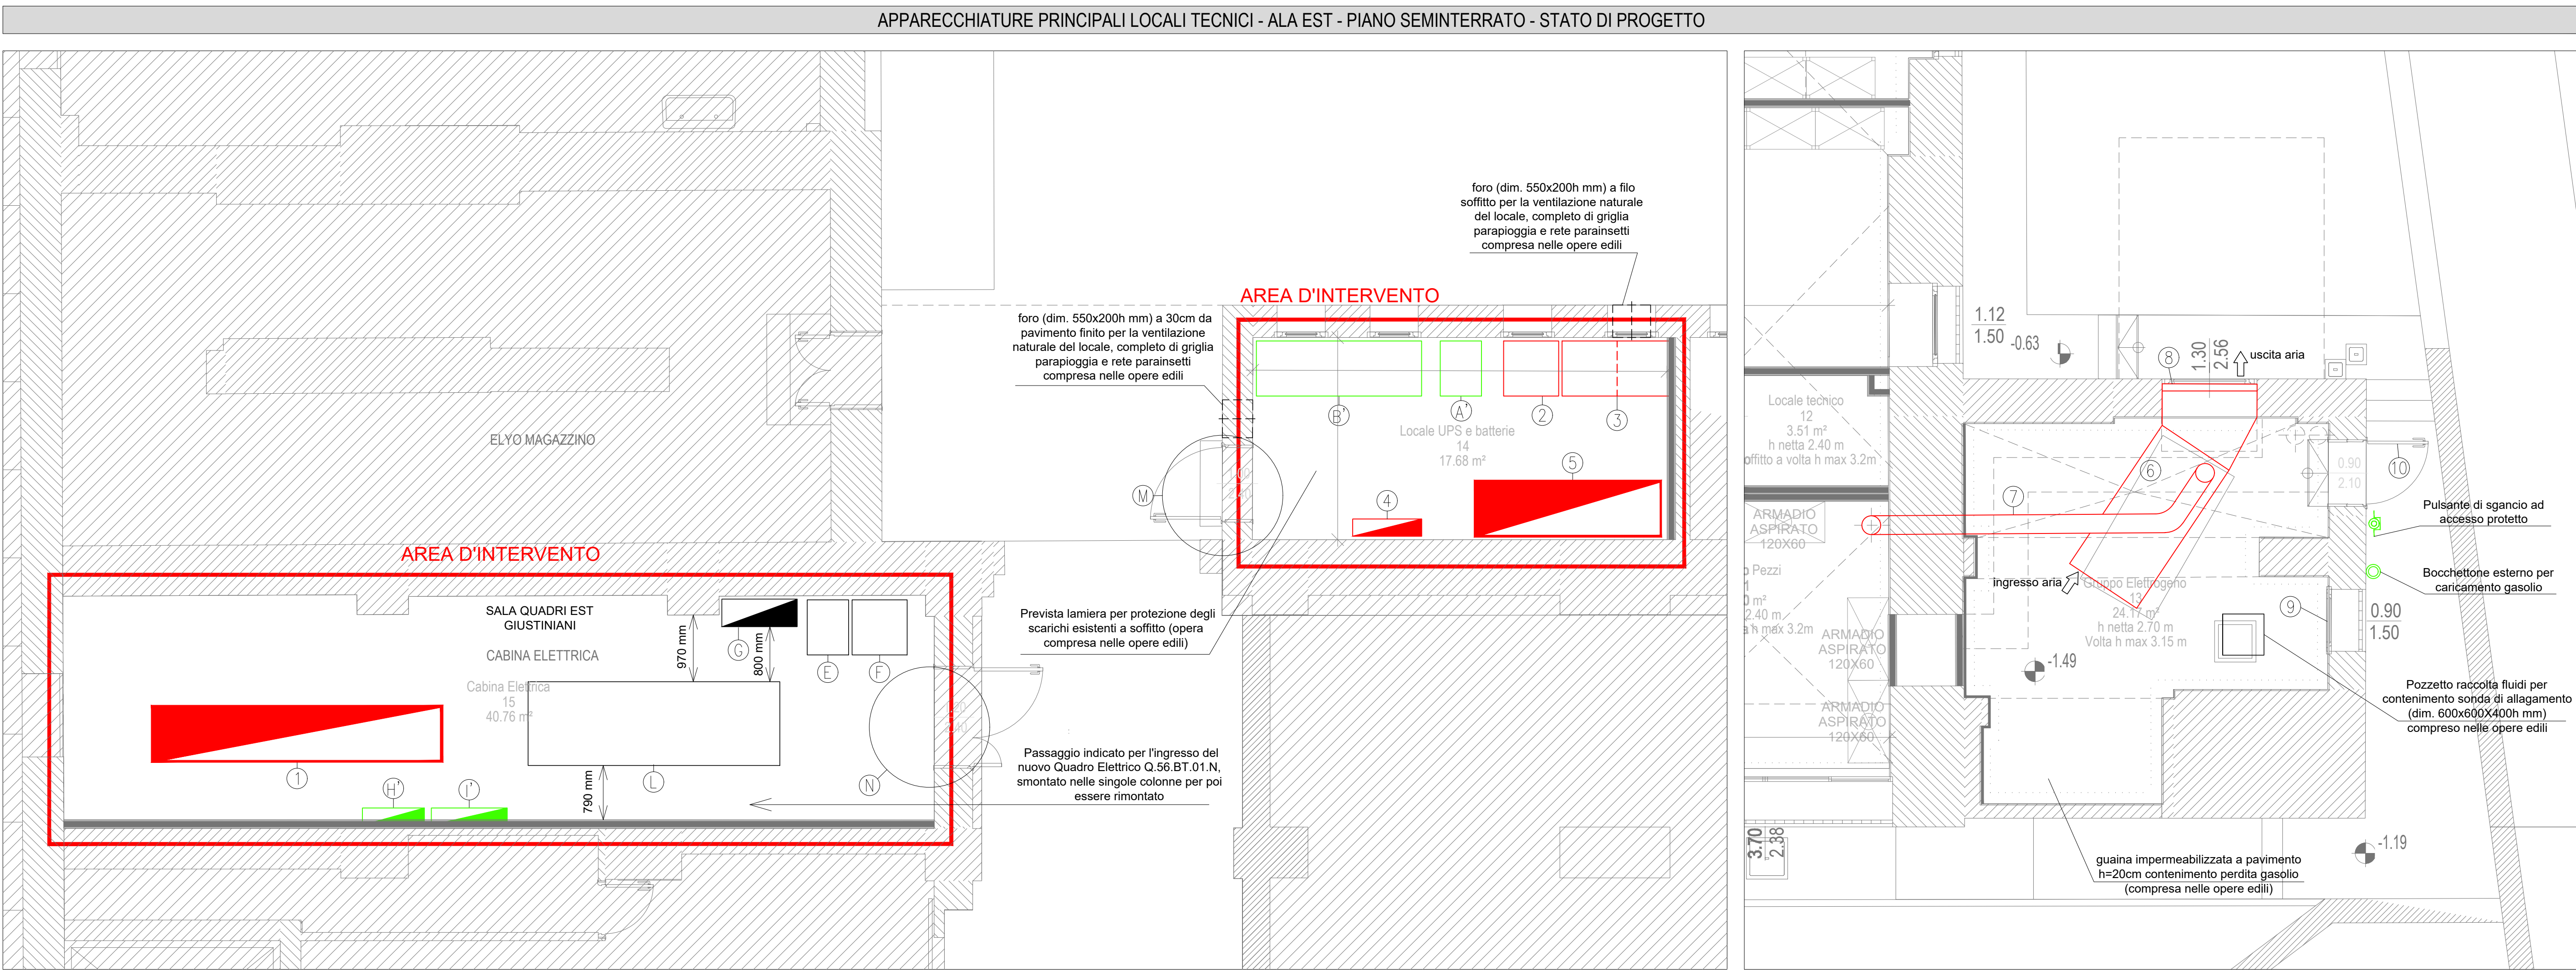

- ATTIVITA' 2: OPERE PER INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO (Q.56.BT.01.N) SALA QUADRI EST GIUSTINIANI
1. SPOSTAMENTO DEL QUADRO ESISTENTE Q.56-01.E.05 (Q.GEN CHIOSTRO - I) E Q.56/SA.01 (QUADRO SERVIZI AUSILIARI SALA QUADRI BT GIUSTINIANI EST - H) E LORO FISSAGGIO PROVVISORIO SULLA PARETE NORD DEL LOCALE ;
 2. POSA DEL NUOVO QUADRO ELETTRICO Q.56.BT.01.N (I) IN ADIACENZA A QUELLO ESISTENTE (L);
 3. RIPOSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEI QUADRI MANOVRA TI AL PUNTO 1 CON NUOVE POSIZIONI IN H' E I' .
- OPERE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE: DOVRANNO ESSERE REALIZZATE PRELIMINARMENTE TUTTE LE OPERE EDILI/STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AI FINI DI PERMETTERE L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE (VEDI OPERE EDILI)

R.T.P. DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

SFP

Striolo, Fochesato & Partners

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs

INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

SFP

Striolo, Fochesato & Partners

Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO

SFP

Striolo, Fochesato & Partners

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE

SFP

Striolo, Fochesato & Partners

Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

SFP

Striolo, Fochesato & Partners

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs

INGEGNERIA

Responsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio Finetti

Responsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Vilian Stefanelli

Responsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ing. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Il Responsabile UDC - Progettazione e Sviluppo Interventi di Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Spina

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:

NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA

PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

COMMESSA 1562

CIG n. 70550191D8 - CLUP n. I91B14000600002

PROGETTO ESECUTIVO

55 - 56 CORPI SUD ED EST

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Layout apparecchiature principali locali di cabina BT, UPS e Gruppo elettrogeno

GENNAIO 2022

701 E.IES.PRO.PAR
